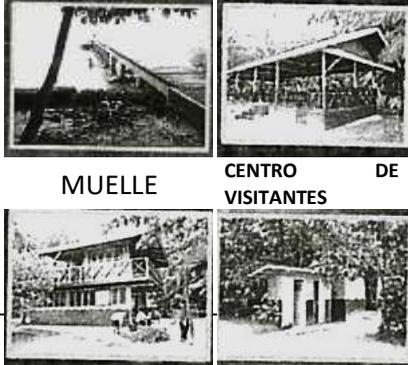


DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO

NOMBRE DEL PROYECTO	ESPECIFICACION DEL PROYECTO	MONTOS	STATUS	FOTOS	Fecha de Inicio Y Fecha de culminación
<p>“Proyecto de Vialidad y Adecuación, Accesos e Interpretación del Castillo de San Lorenzo “El Real del Chagres”</p>	<p>Convenio No. 073/15</p>	<p>B/. 400,000.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Castillo de San Lorenzo: <ul style="list-style-type: none"> -Cartelería instalada. -Apuntalamiento en sitio. ● Facilidades Turísticas: <ul style="list-style-type: none"> -En aprobación de planos. -Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado. -Pendiente de ejecución de obras. -Estudio arqueológico de campo en desarrollo. 		<ul style="list-style-type: none"> ● Fecha de culminación: <ul style="list-style-type: none"> -18 de Enero de 2019 (Adenda No. 1).
<p>“Diseño y Construcción del Centro de Visitantes del Castillo de San Lorenzo “El Real del Chagres”</p>	<p>Convenio No. 062/11</p>	<p>B/. 298,000.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Levantamiento topográfico. -Pendiente de ejecución de obras. -Proceso de tala de árboles ejecutado. 		<ul style="list-style-type: none"> ● Fecha de culminación: <ul style="list-style-type: none"> -08 de Junio de 2019 (Adenda No. 2).
<p>“Habilitación de Facilidades Turísticas en el Parque Nacional, Isla Bastimento, Cayo Zapatilla 2”</p>	<p>Contrato No. 008/17</p>	<p>B/. 437,762.34</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Planos de anteproyectos aprobados. -Planos de construcción en gestión de aprobación. -En gestión del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) por parte de MiAMBIENTE. -La empresa cuenta con 		<ul style="list-style-type: none"> ● Fecha de culminación: <ul style="list-style-type: none"> -20 de Mayo de 2018 -06 de Enero de 2019 (Adenda No. 1, 260 días).

			permiso municipal para inicio del traslado de materiales.	CASA DE GUARDA PARQUES	BAÑOS	
<p>“Ampliación de muelle y mejoras a las infraestructuras de la oficina regional de la Autoridad de Turismo de Panamá, sede Bocas del Toro (Isla Colón)” -CEFATI-</p>	<p>Contrato No. 012/18</p>	<p>B/. 66,000.00</p>	<p>-Proyecto inició ejecución de obras el día miércoles 04 de julio de 2018. -En desarrollo de planos de anteproyecto, para la ampliación del muelle- construcción nueva. -En desarrollo de trabajos de rehabilitación.</p>			<ul style="list-style-type: none"> ● Fecha de culminación: -30 de Diciembre de 2018 (Orden de Proceder 180 días).
<p>“Construcción, diseño arquitectónico, desarrollo de planos de construcción, que incluya Estudio de Impacto Ambiental (EIA), especificaciones técnicas y la construcción de Atracadero Turístico en Puerto Cabimo, corregimiento de Utira, distrito de Río de Jesús, provincia de Veraguas”</p>	<p>Contrato No. 053/10</p>	<p>B/. 135,000.00</p>	<p>-En gestión y formalización del cierre del proyecto.</p>			<ul style="list-style-type: none"> ● Fecha de culminación: -Junio 2018 (En espera de entrega de proyecto al alcalde del distrito de Río de Jesús el Lcdo. Humberto Sanchez).
				Mejoras a las infraestructuras y el muelle		
				Atracadero turístico		
