


AUTORIDAD DE TURISMO DE PANAMÁ
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO

PROYECTOS 2011

Fecha emisión: 17 marzo, 20 abril y 6 junio de 2011.

Flujograma para desarrollo de Proyectos

GESTIÓN DE PROYECTOS

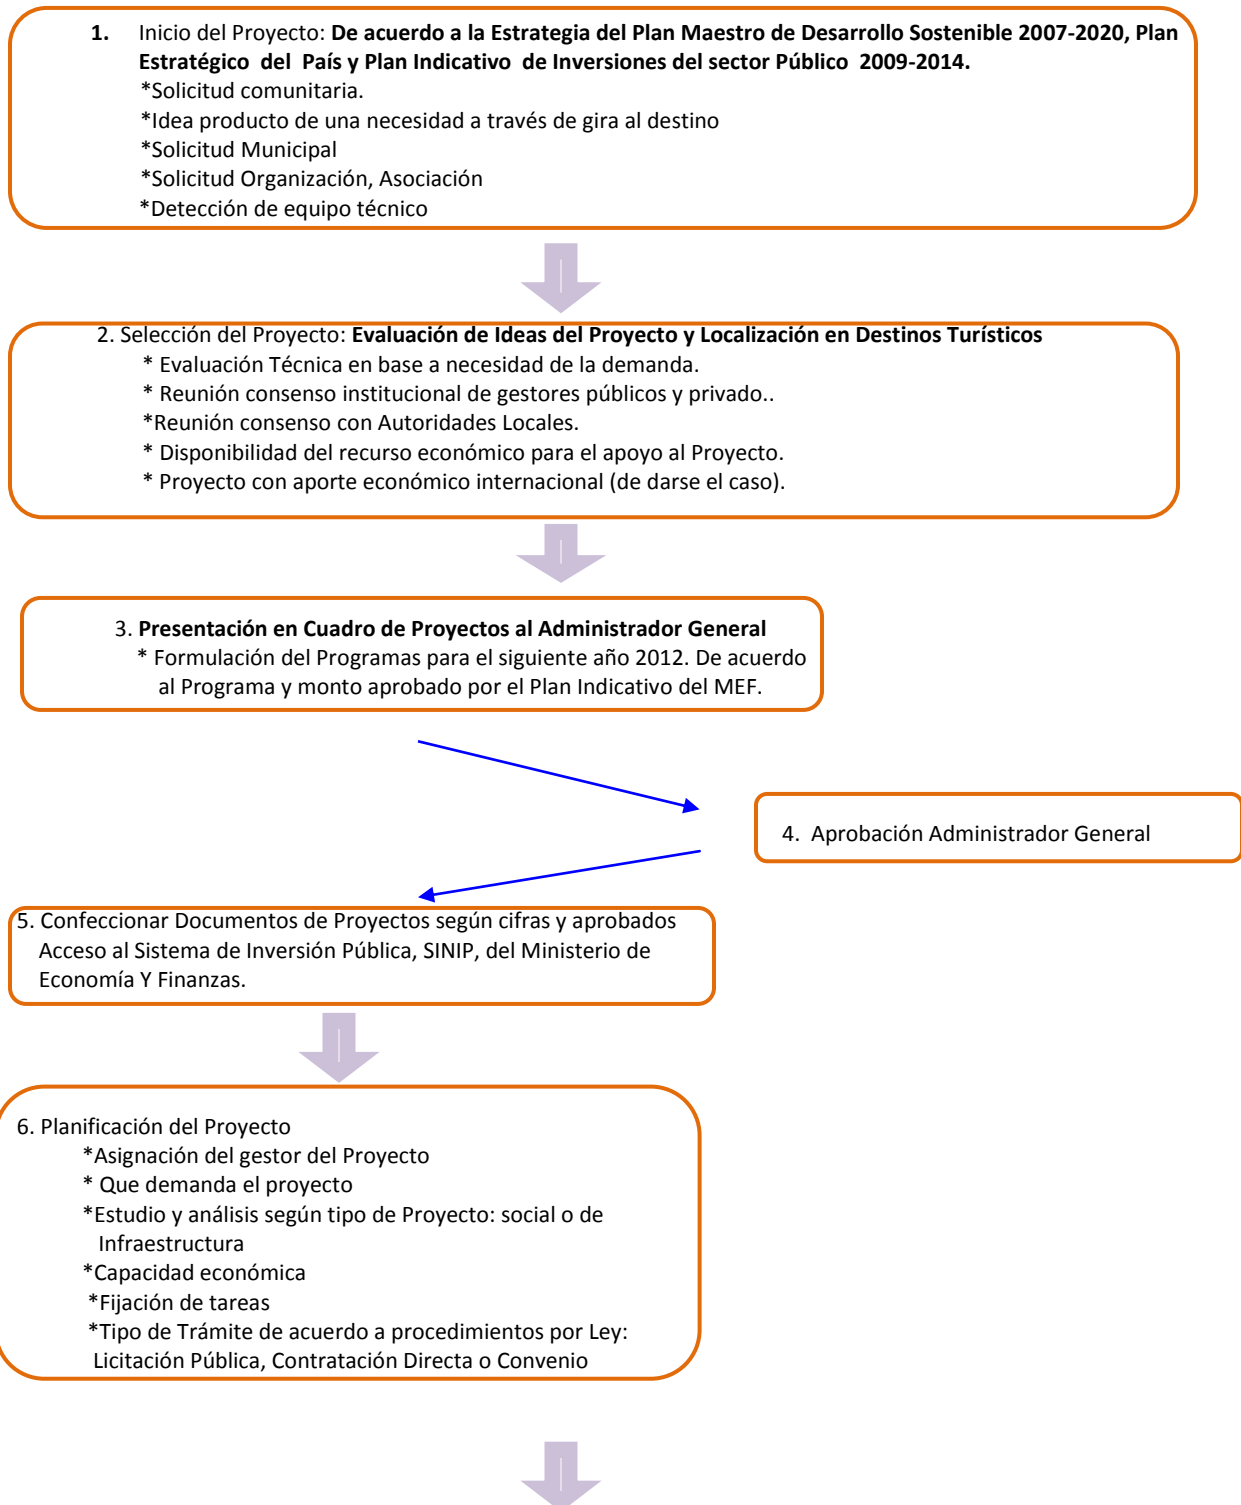

7. **Aprobación de los Proyectos en el año vigente por el Administrador General**
-Y solicitud V°B° de Partida Presupuestaria.

7. Solicitud de aportación de documentos e informes técnicos

- * Documentos legales: (Municipios, Asociaciones, organizaciones).
- * Elaboración del Informe Técnico: Antecedentes, objetivo, plan Institucional, proyección social, Desglose de precios.
- * Confección o actualización de Especificaciones Técnicas.
- * Confección de Requisición, según tipo de requerimiento

8. Según Tipo de Trámite Aprobado

- Licitación Pública
- Contratación Directa-V°B°
Según Ley 48, Ley 22, Decreto
317, 366. Otras

Requisición

Convenio de Cooperación

9. Asesoría Legal

10. Confección de Pliego de Cargos
-Continuación trámite Requisición

10. Confección de Requisición

9. Asesoría Legal

10. Confección de Convenio

11. Departamento de Compras

11. Firma del Administrador
* Firma de la Contraparte

12. Licitación Pública y
Demás procesos

12. Envío a Contraloría para refrendo

*Confección de Contrato a
Empresa Licitada

13. Recibimiento de Contrato Refrendado

13. Recibimiento Convenio

14. Orden de Proceder por parte de
Dirección de Planificación

14. Finanzas procede a trámites de traspaso
aprobado según Convenio: Municipios,
Asociaciones. (Solicitud Docs. necesarios).

15. Envío formal del Traspaso al Municipio

15 ó 16* Inicio de ejecución del Proyecto por parte de la empresa Licitada, Contratada, o por Convenio.



17. Proceso de Evaluación y control del proyecto.

- Visitas de campo para análisis de avance de obra, realizar ajustes, recolectar información para informes técnicos, verificación de cumplimiento de la empresa, otros.
- Tiempo del Proyecto
- Reunión coordinación con empresa licitada, Municipios, Asociaciones, Organizaciones.



18* Evaluación del Proyecto

- * Revisión del diseño.
- * Continuación en la verificación del proyecto.
- * Visitas de campo
- *Observación seguimiento de los objetivos. Todos los Involucrados.
- *Avance de acuerdo al tiempo.



19* Terminación del Proyecto

- * Verificación
- *Entrega por parte de la empresa Licitada y Recibimiento por parte de ATP y Dirección de Ingeniería De la Contraloría, Municipios.
- *Memo de satisfacción por parte de Unidad Ejecutora.



20* Dirección de Administración y Finanzas

- * Proceso de pago por parte de Sección de Tesorería.
- * Presentación de Gestión de Cobro. Empresa Licitada. Contratación directa, requisiciones.
- * Trámites que corresponden: Tesorería, Compras, Contabilidad, Presupuesto.
- *Oficina de Control Fiscal de la Contraloría General De la República.
- * Trámites que corresponden.
- * Pago o cancelación por obra terminada.

AUTORIDAD DE TURISMO DE PANAMÁ
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO

PROYECTO TRANSPARENCIA
AÑO 2011

Número de Información presentadas a la Institución.	Total	No. Solicitudes Resueltas	No. Solicitudes Negadas	Pendientes
<ul style="list-style-type: none"> Informaciones varias(solicitudes Asistencia a reuniones, incorporación de propuestas, otros) 	35	34	1	0
<ul style="list-style-type: none"> Asistencia Técnica a fincas Agroturísticas 	22	20	0	2
<ul style="list-style-type: none"> Verificación en Zonas Turísticas 	15	12	2	1
<ul style="list-style-type: none"> Actualización en sitios para verificación de atractivos culturales y naturales en el Sistema de Información Geográfica, SIG 	20	15	0	5
<ul style="list-style-type: none"> Estudios de Impacto Ambiental, EIA 	14	7	0	7
<ul style="list-style-type: none"> Inspecciones de Cumplimiento en conjunto con ANAM y ATP: EIA Evaluado por ATP, evaluado y aprobado por ANAM. Solicitud de Proyecto de Hospedaje, Empresa turística Privada. 	1	1	0	0
<ul style="list-style-type: none"> Inspecciones de Cumplimiento en conjunto con ANAM y ATP: EIA en Evaluación Proyectos de Inversión Pública. 	3	0	0	3 en evaluación
<p>Total de Proyectos de Inversión: por solicitud, consenso y validación Comunitaria e Institucional. Incluye Proyectos en Convenios (Municipios, Asociaciones, otros).</p>	48= 43 + 5 proyectos de Convenios 2010	18=16 Proyectos ejecutados. 2 Proyectos ejecutados de Convenios	1 Proyecto no viable. 1 Adenda para Proyecto.	24+ 2 Proyecto en Convenio Marco y 2 Proyectos de Convenios 2010 en ejecución.
